




## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:  
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381  
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it  
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

### PROGETTO SEDI VIA MENTANA 3 E 7

#### PROGETTO ESECUTIVO

### INTERVENTI DI RISANAMENTO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLE SEDI CONSORZIALI DI VIA MENTANA 3 E 7

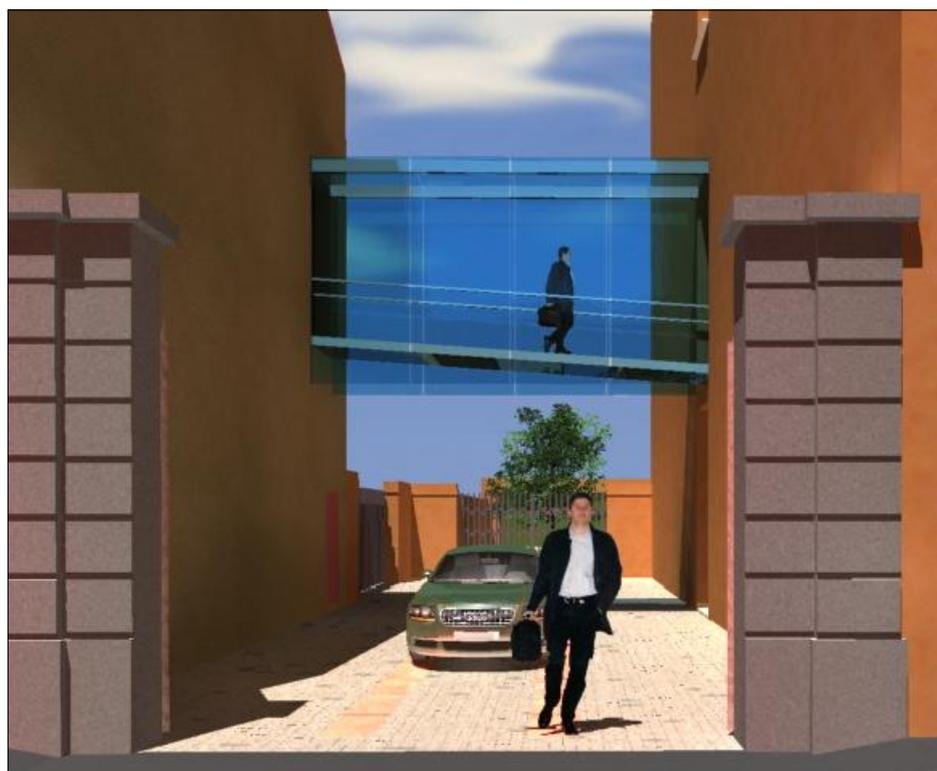

#### RELAZIONI, PROGRAMMA LAVORI E SICUREZZA

### CRONOPROGRAMMA

Aggiornamento: Febbraio 2021

Data: 16 SET. 2020

Elab.:

# 1.5

#### PROGETTAZIONE GENERALE INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO

IL PROGETTISTA  
(Ing. Marco Volpin)



Ing. Simona Pusinanti  
Geom. Carlo Mazzanti  
Geom. Pietro Ghisellini

#### PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

I PROGETTISTI  
(Arch. Carlo PISO)



(Arch. Gian Paolo RUBIN)



#### PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI

IL PROGETTISTA  
(Ing. Beatrice Bergamini)



#### PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE

IL PROGETTISTA  
(Ing. Giovanni Paolazzi)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Marco Ardizoni)

*marco Ardizoni*

Tempo settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Note			
<b>Fasi</b>																														
<b>N. 1</b>																												Le operazioni di accantieramento comprenderanno la posa di cartellonistica di sicurezza, posa recinzioni, baracca e wc di cantiere, recinzione area di deposito all'interno del parcheggio consorziale.		
<b>N. 2</b>																												Saranno realizzati ponteggi perimetralmente il palazzo di Mentana 3 e lateralmente al palazzo di Mentana 7 così da consentire le lavorazioni, gli accessi ed il carico/scarico materiali; Ponteggio da realizzare secondo schema di montaggio produttore e corredato da PIMUS specifico.		
<b>N. 3</b>																												La demolizione delle murature, delle tramezze, dei solai e la rimozione dei controsoffitti sarà coordinata alla realizzazione dei ponteggi interni, in particolare al piano primo del palazzo Mentana 3, in modo che le lavorazioni siano condotte in totale sicurezza;		
<b>N. 4</b>																												La rimozione, lo spostamento e la ricollocazione nuovi impianti avverrà simultaneamente alla demolizione e ricostruzione murature nonché alla costruzione nuovo ascensore e passerella di collegamento palazzi; Non si prevedono sovrapposizioni di lavorazioni in quanto saranno divise spazialmente.		
<b>N. 5</b>																												Le operazioni di ricostruzione tramezze e assistenza muraria per la costruzione ascensore e passerella si svolgeranno nell'arco del periodo previsto e non saranno interferenti con altre lavorazioni, saranno sfasate spazialmente e temporalmente. Eventuale tinteggiatura facciate palazzo Mentana 3 a seguito dei lavori		
<b>N. 6</b>																												La realizzazione del nuovo ascensore è subordinata alla demolizione parziale dei solai di Mentana 7 e allo spostamento degli impianti esistenti, le lavorazioni saranno sfasate temporalmente tra loro e quindi non interferenti.		
<b>N. 7</b>																												Le operazioni di costruzione nuova passerella saranno eseguite principalmente da stradello di accesso al parcheggio consorziale, preventivamente saranno create aperture nei prospetti palazzi Mentana 3 e 7 con relativa cerchiatura strutturale in acciaio.		
<b>N. 8</b>																													Lavorazione realizzata operando all'interno degli ambienti posti al piano primo del palazzo Mentana 3 previa realizzazione di ponteggio interno con piano di lavoro in sommità da cui poter operare e stoccare parte della carpenteria necessaria alla realizzazione di rinforzo strutturale copertura; Questa lavorazione non sarà interferente con altre.	
<b>N. 9</b>																														La rimozione dei ponteggi sarà subordinata al termine delle specifiche lavorazioni, non sarà interferente con altri lavori; Regolamentazione della viabilità in modo da non creare interferenza tra mezzi d'opera e terzi.
<b>N. 10</b>																													Le operazioni di smobilitazione cantiere e pulizia finale comprenderanno la rimozione di cartellonistica di sicurezza, delle recinzioni, baracca e wc di cantiere, recinzione area di deposito all'interno del parcheggio consorziale e sistemazioni all'interno degli ambienti palazzi Mentana 3 e 7; Comprenderanno altresì eventuali ripristini stradali o murari ammalorati a seguito dei lavori.	
